

No. Contrato: LO-925059986-E2-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-002-2020

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato numero **LO-925059986-E2-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-002-2020**

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, Siendo las 10:00 horas del día sábado, 31 de julio del 2021, de acuerdo con la cita notificada al contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos se reunieron en el plantel **Universidad Autónoma de Sinaloa. Centro Educativo de Prácticas Profesionales. Culiacán; Sinaloa.** Con **C.C.T. 25MSU0013B**, ubicado en **Av. Francisco Labastida Ochoa #2087, Fracc. Verona, C.P. 80064, Culiacán; Sinaloa** Las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas. Figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR, CONSTRUCCION DE BARDAS LATERALES Y FRONTAL, OBRA EXTERIOR (PASILLOS, RAMPAS, ESCALERAS), PLAZAS Y TECHUMBRE, CISTERNA DE 10,000 LTS. INSTALACIONES ELECTRICAS RED DE MEDIA TENSION, ACCESO PRINCIPAL. (CENTRO EDUCATIVO DE PRACTICAS PROFESIONALES)


III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual de la obra No. 200417 que es de \$ 16'884,511.56 (SON: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N.), correspondiente al contrato numero **LO-925059986-E2-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-002-2020**.
- El importe del convenio es de \$ 213,587.64 (SON: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.)
- El importe total del contrato + convenio es de \$ 17'098,099.20 (SON: DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

IV. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:
Conforme al periodo del contrato:
Fecha de inicio: miércoles, 03 de marzo de 2021
Fecha de terminación: sábado, 31 de julio de 2021
Plazo de ejecución: 151 días naturales

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de inicio: miércoles, 03 de marzo de 2021
Fecha de terminación: sábado, 31 de julio de 2021
Plazo de ejecución: 151 días naturales

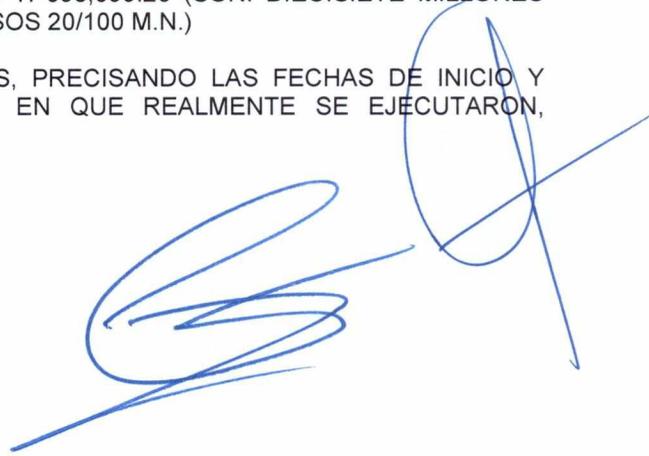

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACION.

| EST | PERIODO DE EJECUCION | IMPORTE | IVA | MONTO EJERCIDO | OBSERVACION |
|-----|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | 03/03/2021 AL 17/03/2021 | \$ 246,445.39 | \$ 39,431.26 | \$ 285,876.65 | PAGADA |
| 2 | 18/03/2021 AL 31/03/2021 | \$ 2'906,850.02 | \$ 465,096.00 | \$ 3'371,946.02 | PAGADA |



| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 3 | 01/04/2021 AL 24/04/2021 | \$ 2'010,218.02 | \$ 321,634.88 | \$ 2'331,852.90 | PAGADA |
| 4 | 25/04/2021 AL 15/05/2021 | \$ 3'388,519.17 | \$ 542,163.07 | \$ 3'930,682.24 | PAGADA |
| 5 | 16/05/2021 AL 15/06/2021 | \$ 3'016,223.81 | \$ 482,595.81 | \$ 3'498,819.62 | PAGADA |
| FINIQUITO | 16/06/2021 AL 31/07/2021 | \$ 3'171,484.28 | \$ 507,437.49 | \$ 3'678,921.77 | PAGADA |
| | TOTAL: | \$ 14'739,740.69 | \$ 2'358,358.51 | \$ 17'098,099.20 | |

- VI. DECLARACION DE LA PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista INGENIERÍA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A. DE C.V. hace entrega a la residencia de la obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR, CONSTRUCCION DE BARDAS LATERALES Y FRONTAL, OBRA EXTERIOR (PASILLOS, RAMPAS, ESCALERAS), PLAZAS Y TECHUMBRE, CISTERNA DE 10,000 LTS. INSTALACIONES ELECTRICAS RED DE MEDIA TENSION, ACCESO PRINCIPAL. (CENTRO EDUCATIVO DE PRACTICAS PROFESIONALES).

- VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS ANEXADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE LA OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISION POR PARTE DE LA CONTRATISTA.

1. ESTIMACION FINIQUITO
2. FINIQUITO DE OBRA
3. FINIQUITO DE CONTRATO
4. ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA
5. ACTA DE ENTREGA OPERATIVA

- VIII. ENTREGA DE GARANTIA.

De conformidad con el artículo 66 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y último párrafo del artículo 166 de su reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resulten de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiera incurrido consistente en el número de fianza **21A10363**

ORGANISMO ESTATAL

CONTRATISTA

ARQ. JORGE PEREZ RUBIO

ING. ADALBERTO EFRÁIN LOAIZA
SÁNCHEZ

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
UAS

REPRESENTANTE LEGAL DE INGENIERÍA DE
NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A. DE C.V.

TESTIGOS

DR. GERARDO ALAPIZCO CASTRO
SECRETARIO GENERAL UAS
TESTIGO

ING. JOSE ALFREDO INZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA
TESTIGO

Esta hoja forma parte integrante del acta de recepción física del contrato LO-925059986-E2-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-002-2020 de fecha Martes, 02 de marzo de 2021.



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA

Siendo las 11:00 horas del 31 de julio de 2021 y estando presentes en el plantel educativo **Universidad Autónoma de Sinaloa. Centro Educativo de Prácticas Profesionales. Culiacán; Sinaloa. Con clave de centro de trabajo C.C.T. 25MSU0013B, ubicado en Calle: Av. Francisco Labastida Ochoa #2087, Fracc. Verona, C.P. 80064, Culiacán. En el estado de Sinaloa** las persona cuyos nombres, representaciones y firma que aparecen al final de esta acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se elabora la presente acta, para formalizar la entrega física de los trabajos al área operativa, según contrato LO-925059986-E2-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-002-2020, a cargo de la empresa **Ingeniería de Negocios Sostenibles S. A. de C. V.** relativo a CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR, CONSTRUCCION DE BARDAS LATERALES Y FRONTAL, OBRA EXTERIOR (PASILLOS, RAMPAS, ESCALERAS), PLAZAS Y TECHUMBRE, CISTERNA DE 10,000 LTS. INSTALACIONES ELECTRICAS RED DE MEDIA TENSION, ACCESO PRINCIPAL. (CENTRO EDUCATIVO DE PRACTICAS PROFESIONALES). CULIACÁN, SINALOA.

La UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, hace entrega en este acto, de y los equipos de instalación permanente que en su caso correspondan. Así como la documentación correspondiente a esta entrega-recepción.

La Dirección del Plantel, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así mismo, deberá observar a lo indicado en la normatividad ambiental durante la operación del plantel.

Previa comprobación por parte del Director del plantel, que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, hace entrega de los trabajos descritos, dentro de los términos que rige la norma, a entera satisfacción, para su operación y mantenimiento, en su caso, de conformidad con el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Entrega:

POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

ARQ. JORGE PEREZ RUBIO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA UAS

Recibe:

Director del Plantel

DR. GERARDO ALAPIZCO CASTRO

SECRETARIO GENERAL U.A.S.

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción al Área Operativa del Contrato No LO-925059986-E2-2021 / UAS-DCM-FAMP-LP-002-2020 de fecha martes, 02 de marzo de 2021.
