

DATOS DE LA ACCIÓN

NOMBRE DEL PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.			CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT):	25MSU0013B
SINALOA	CULIACAN			CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.	
ENTIDAD FEDERATIVA	DELEGACIÓN / MUNICIPIO			DIRECCIÓN	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$6,359,040.00

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES

FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021

	IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%									6.25%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%									10.45%



ARQ. JORGE PEREZ RUBIO
DIRECTOR DCM-UIS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-UIS

ING. JOSE ALFREDO INZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

DATOS DE LA ACCIÓN

NOMBRE DEL PLANTEL:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE MEDICINA.		CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 25MSU0013B	
SINALOA		CULIACAN		CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.	
ENTIDAD FEDERATIVA		DELEGACIÓN / MUNICIPIO		DIRECCIÓN	
NOMBRE DE LA EMPRESA:		LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.: \$6,359,040.00	

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES

FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021

		IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%	6.25%									12.50%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%	10.45%									20.90%



ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO
DIRECTOR DOM-IAS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DOM-IAS

ING. JOSE ALFREDO PINZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

DATOS DE LA ACCIÓN

NOMBRE DEL PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE MEDICINA.	CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT):	25MSU0013B
SINALOA	CULIACAN	CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.	
ENTIDAD FEDERATIVA	DELEGACIÓN / MUNICIPIO	DIRECCIÓN	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$6,359,040.00

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES

FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021

	IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%	6.25%	6.25%							18.75%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%	10.45%	10.45%							31.35%



ARQ. JORGE PEREZ RUBIO
DIRECTOR DCM-HAS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-HAS

ING. JOSE ALFREDO INZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

**INFORME DE AVANCE 100% DE LA OBRA CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROGRAMA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM
ANEXO XV**

Fecha del Informe: sábado, 31 de julio de 2021

DATOS DE LA ACCIÓN

NOMBRE DEL PLANTEL:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.		CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 25MSU0013B	
SINALOA		CULIACAN		CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.	
ENTIDAD FEDERATIVA		DELEGACIÓN / MUNICIPIO		DIRECCIÓN	
NOMBRE DE LA EMPRESA:		LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.: \$6,359,040.00	

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES


FECHA DE INICIO:

03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO:

31 DE JULIO DEL 2021

		IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%							25.00%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%							41.80%

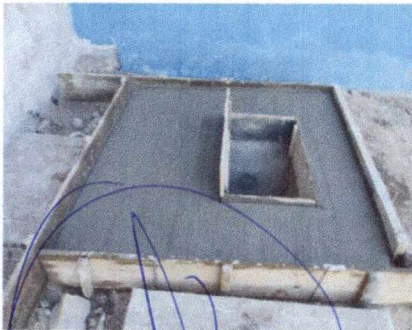

ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO
DIRECTOR DOM-JAS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DOM-JAS

ING. JOSE ALFREDO PINZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

**INFORME DE AVANCE 100% DE LA OBRA CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROGRAMA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM
ANEXO XV**

Fecha del Informe: sábado, 31 de julio de 2021

DATOS DE LA ACCIÓN





NOMBRE DEL PLANTEL:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.		CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 25MSU0013B	
SINALOA		CULIACAN		CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.	
ENTIDAD FEDERATIVA		DELEGACIÓN / MUNICIPIO		DIRECCIÓN	
NOMBRE DE LA EMPRESA:		LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.: \$6,359,040.00	

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES

FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021

	IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	8.96%					33.96%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	11.06%					52.86%

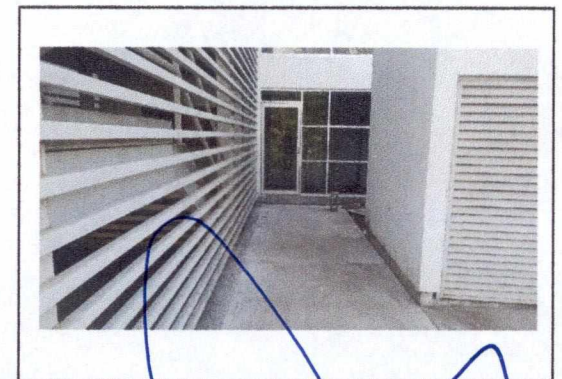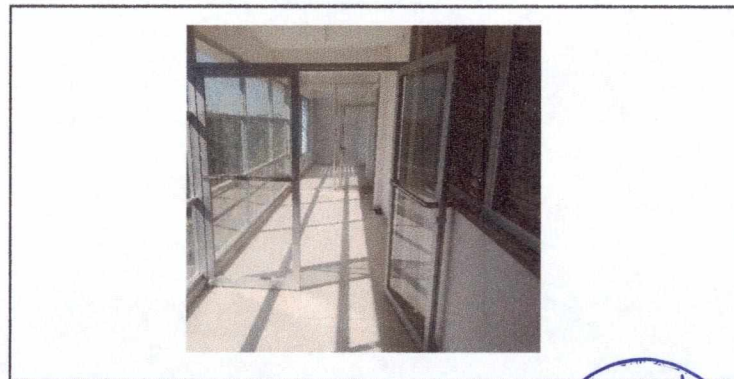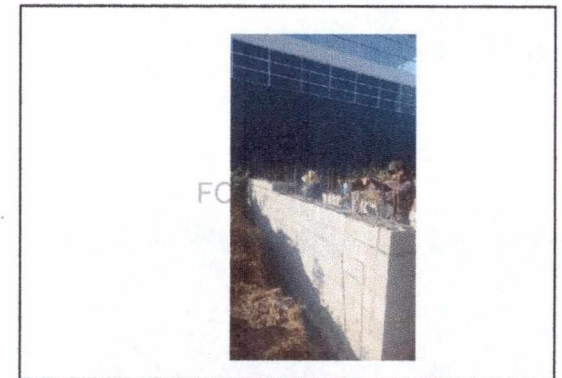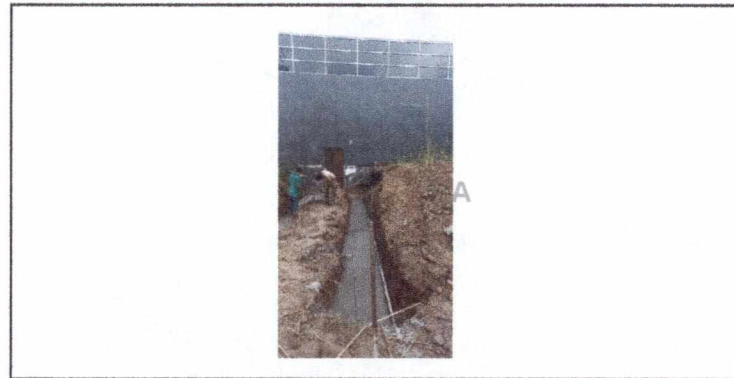

ARQ. JORGE PEREZ RUBIO
DIRECTOR DCM-UAS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-UAS

ING. JOSE ALFREDO INZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

DATOS DE LA ACCIÓN






NOMBRE DEL PLANTEL:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.			CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 25MSU0013B	
SINALOA		CULIACAN			CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.	
ENTIDAD FEDERATIVA		DELEGACIÓN / MUNICIPIO			DIRECCIÓN	
NOMNBRE DE LA EMPRESA:		LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.: \$6,359,040.00	

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES

FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021

	IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	8.96%	8.96%				42.92%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	11.06%	11.06%				63.92%

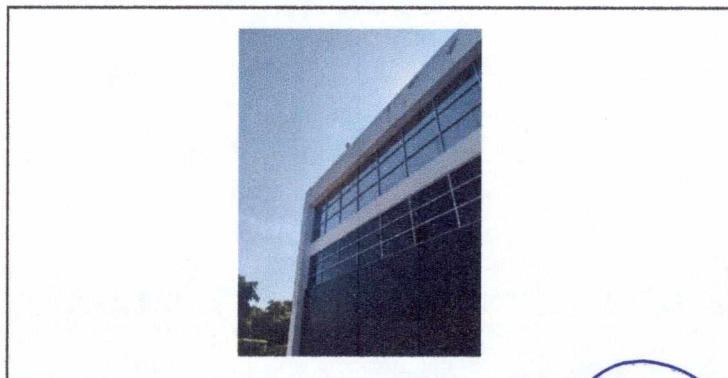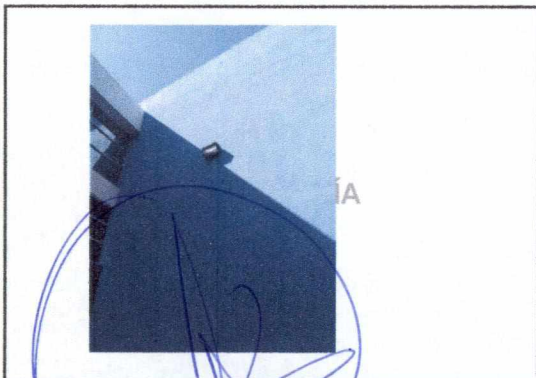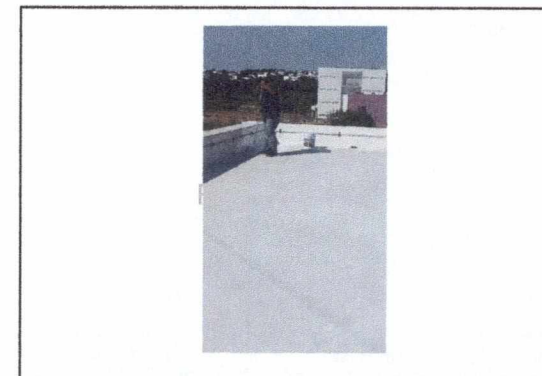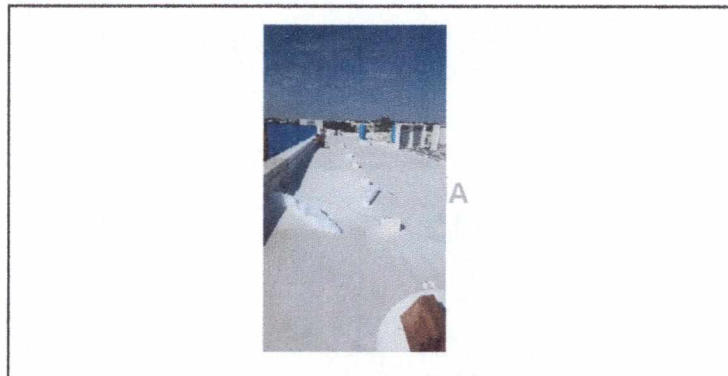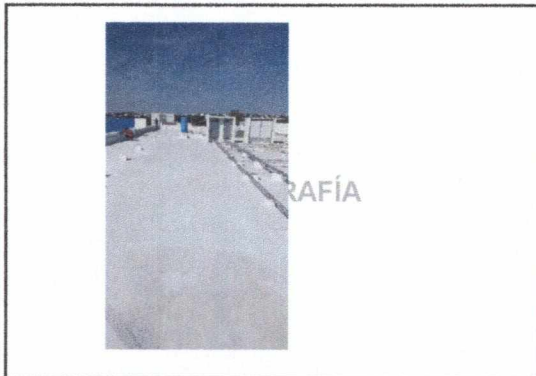

ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO
DIRECTOR DCM-UAS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-UAS

ING. JOSE ALFREDO INZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

**INFORME DE AVANCE 100% DE LA OBRA CON PARTICIPACION DEL COMITÉ DE MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. PROGRAMA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM
ANEXO XV**

Fecha del Informe: sábado, 31 de julio de 2021

DATOS DE LA ACCIÓN

NOMBRE DEL PLANTEL:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.			CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT):		25MSU0013B
SINALOA		CULIACAN			CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.		
ENTIDAD FEDERATIVA		DELEGACIÓN / MUNICIPIO			DIRECCIÓN		
NOMNBRE DE LA EMPRESA:		LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.:		\$6,359,040.00

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES





FECHA DE INICIO :

03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO :

31 DE JULIO DEL 2021

	IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	8.96%	8.96%	8.96%			51.88%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	11.06%	11.06%	11.06%			74.98%

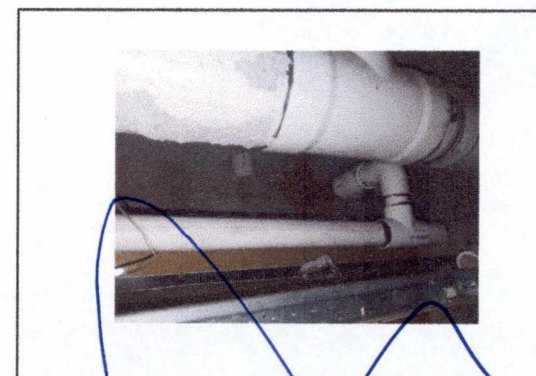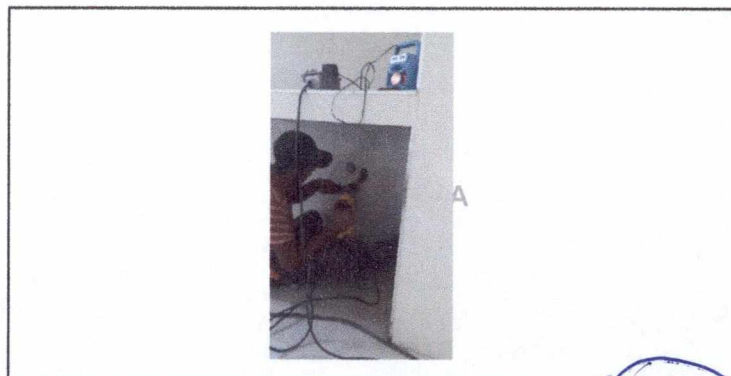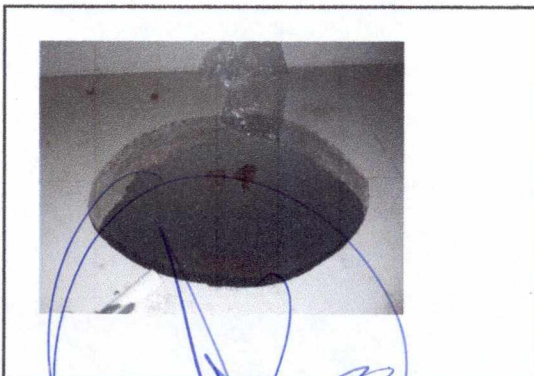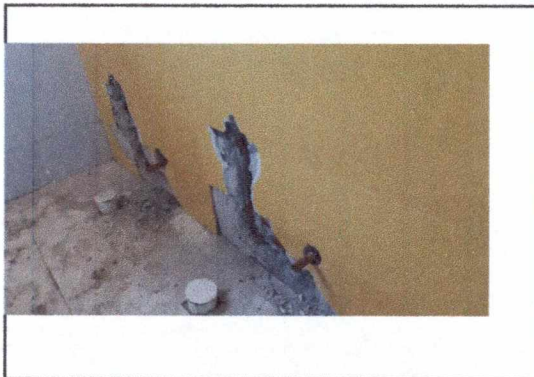

ARQ. JORGE PEREZ RUBIO
DIRECTOR DCM-UAS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-UAS

ING. JOSE ALFREDO INZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

DATOS DE LA ACCIÓN


NOMBRE DEL PLANTEL:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.			CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 25MSU0013B	
SINALOA		CULIACAN			CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.	
ENTIDAD FEDERATIVA		DELEGACIÓN / MUNICIPIO			DIRECCIÓN	
NOMBRE DE LA EMPRESA:		LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.: \$6,359,040.00	

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES

FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021

		IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	8.96%	8.96%	8.96%	16.04%			67.92%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	11.06%	11.06%	11.06%	8.25%			83.23%

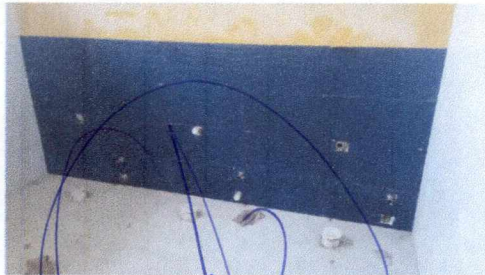

ARQ. JORGE PEREZ RUBIO
DIRECTOR DCM-UAS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-UAS

ING. JOSE ALFREDO MUZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

DATOS DE LA ACCIÓN





NOMBRE DEL PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.	CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT):	25MSU0013B
SINALOA	CULIACAN	CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.	
ENTIDAD FEDERATIVA	DELEGACIÓN / MUNICIPIO	DIRECCIÓN	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.:	\$6,359,040.00

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES

FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2021

	IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	8.96%	8.96%	8.96%	16.04%	16.04%	83.96%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	11.06%	11.06%	11.06%	8.25%	8.25%	91.48%

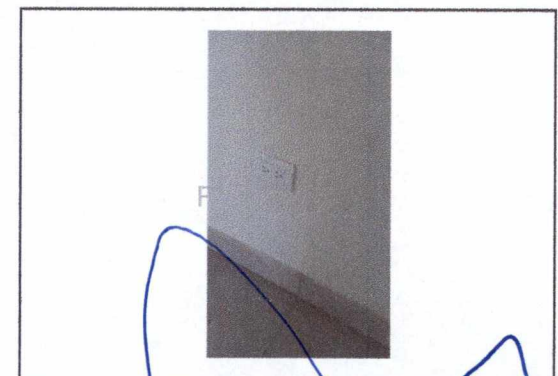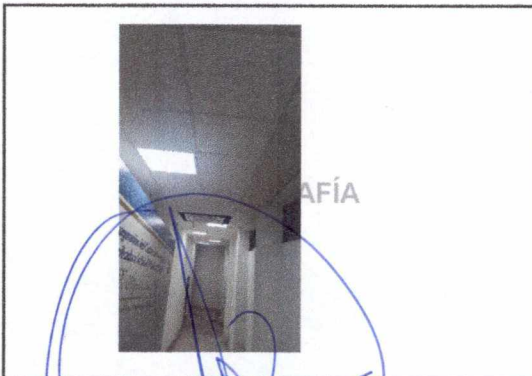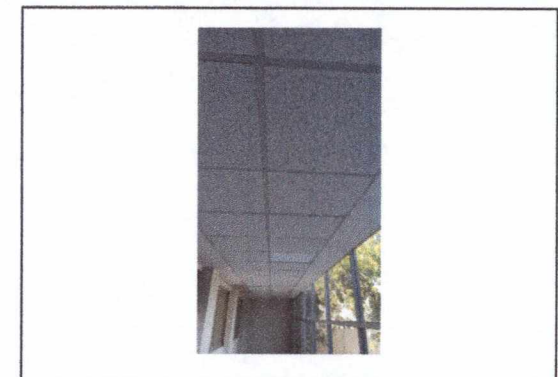

ARQ. JORGE PEREZ RUBIO
DIRECTOR DCM- UAS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DCM- UAS

ING. JOSE ALFREDO INZUNZA VALENZUELA
SURGERENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA

DATOS DE LA ACCIÓN

NOMBRE DEL PLANTEL:		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.		CLAVE CENTRO DE TRABAJO (CCT): 25MSU0013B	
SINALOA		CULIACAN		CALLE: SAUCES, LOS FRESNOS S/N FRACIONAMIENTO, 80019, CULIACAN, SINALOA.	
ENTIDAD FEDERATIVA		DELEGACIÓN / MUNICIPIO		DIRECCIÓN	
NOMNBRE DE LA EMPRESA:		LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO C/ I.V.A.: \$6,359,040.00	

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN EN PORCENTAJES


FECHA DE INICIO :

03 DE MARZO DEL 2021

FECHA DE TÉRMINO :

31 DE JULIO DEL 2021

	IMPORTE DE LA PARTIDA	QUINCENA No. 1	QUINCENA No. 2	QUINCENA No. 3	QUINCENA No. 4	QUINCENA No. 5	QUINCENA No. 6	QUINCENA No. 7	QUINCENA No. 8	QUINCENA No. 9	QUINCENA No. 10	PORCENTAJE TOTAL
Avance Físico	Programado	\$6,359,040.00	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	8.96%	8.96%	8.96%	16.04%	16.04%	100.00%
	Real	\$6,359,040.00	10.45%	10.45%	10.45%	10.45%	11.06%	11.06%	11.06%	8.25%	8.52%	100.00%



ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO
DIRECTOR DCM-UAS

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA DCM-UAS

ING. JOSE ALFREDO VINZUNZA VALENZUELA
SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL INIFED EN SINALOA



FECHA: 31/07/2021

CONTRATISTA:
LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO

DOMICILIO: CALLE: MARIANO ESCOBEDO, 361 CENTRO.
R.F.C. ZAJL740825G12

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS FINIQUITO

No. DE PGO: 20211 No. DE OBRA: 200301 C.C.T. 25MSU0013B ESTIMACIÓN: FINIQUITO
PLANTEL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA. LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN: TERMINACION DE EDIFICIO DE CENTRO DE INVESTIGACION

100 ACCESO

FOTOS PANORAMICAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



200 SALIDA DE EMERGENCIA

FOTOS PANORAMICAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



ELABORÓ:

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
CONTRATISTA

AUTORIZÓ:

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR



FECHA: 31/07/2021

CONTRATISTA:
LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO

DOMICILIO: CALLE: MARIANO ESCOBEDO, 361 CENTRO.
R.F.C. ZAJL740825G12

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS FINIQUITO

No. DE PGO: 20211 No. DE OBRA: 200301 C.C.T. 25MSU0013B ESTIMACIÓN: FINIQUITO
 PLANTEL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA. LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
 DESCRIPCIÓN: TERMINACION DE EDIFICIO DE CENTRO DE INVESTIGACION

300 ALBAÑILERIA Y ACABADOS

FOTOS PANORAMICAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

ELABORÓ:

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
CONTRATISTA

AUTORIZÓ:

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR



FECHA: 31/07/2021

CONTRATISTA:
LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
DOMICILIO: CALLE: MARIANO ESCOBEDO, 361 CENTRO.
R.F.C. ZAJL740825G12

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


FOTOGRAFÍAS FINIQUITO

No. DE PGO: 20211 No. DE OBRA: 200301 C.C.T. 25MSU0013B ESTIMACIÓN: FINIQUITO
PLANTEL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA. LOCALIDAD: CULIACAN MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN: TERMINACION DE EDIFICIO DE CENTRO DE INVESTIGACION

400 HERRERIA Y CANCELERIA

FOTOS PANORAMICAS

ANTES



DURANTE




DESPUES



500 AZOTEA

FOTOS PANORAMICAS

ANTES

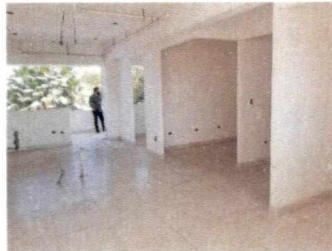

DURANTE



DESPUES



ELABORÓ:

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
CONTRATISTA

AUTORIZÓ:

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR



FECHA: 31/07/2021

CONTRATISTA:
LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO

DOMICILIO: CALLE: MARIANO ESCOBEDO, 361 CENTRO.
R.F.C. ZAJL740825G12

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


FOTOGRAFÍAS FINIQUITO

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200301	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.				LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	TERMINACION DE EDIFICIO DE CENTRO DE INVESTIGACION						


INST INSTALACIONES

FOTOS PANORAMICAS



ANTES



DURANTE



DESPUES



ELABORÓ:

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
CONTRATISTA

AUTORIZÓ:

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR



FECHA: 31/07/2021

CONTRATISTA:
LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO

DOMICILIO: CALLE: MARIANO ESCOBEDO, 361 CENTRO.
R.F.C. ZAJL740825G12

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS FINIQUITO

No. DE PGO:	20211	No. DE OBRA:	200301	C.C.T.	25MSU0013B	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	
PLANTEL:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA / UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE MEDICINA.				LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	TERMINACION DE EDIFICIO DE CENTRO DE INVESTIGACION							

ANTES



DURANTE



DESPUES



ELABORÓ:

LUIS JAEN ZAZUETA JACOBO
CONTRATISTA

AUTORIZÓ:

ARQ. JOSE MANUEL MEDINA
SUPERVISOR
