

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

31 de Marzo 2022

FECHA DE CORTE:

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Entidad federal: Sinaloa

Clave Inst 911: 25MSU0013B

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Desarrollo
Teléfono: (667) 1 02 84 76 Y (667) 7593873
Correo electrónico: soilagaxiola@uas.edu.mx, planeacion@uas.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Arq. Jorge Pérez Rubio
Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (667) 7597792
Correo electrónico: uascdm@hotmial.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas				
		Obra de continuidad	Equipoamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Unidad Regional Centro. Campus Rafael Buelna, Culiacán, Sinaloa. Auditorio para 1,000 personas (Terminación de obra exterior)	X					\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00			1591			100%	11/10/2021	31/03/2022							
2	Bienestar Universitario y ADIUS, Modulo de 10 entre ejes 3 niveles.	X					\$ 18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00			1599			100%	11/10/2021	31/03/2022							
3	Construcción de Edificio para Archivo Integral. DES de la IES.	X					\$ 17,603,134.31	\$17,603,134.31	\$0.00			1455			100%	11/19/2021	31/03/2022							
							\$41,603,134.31	\$41,603,134.31	\$0.00															

Soila M. Gaxiola C.
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO

Arq. Jorge Pérez Rubio
ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

31 de Marzo 2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO



Porcentaje de avance

100%

PRICIDAD: 1

Nombre de la obra: **Unidad Regional Centro. Campus Rafael Buelna, Culiacán, Sinaloa. Auditorio para 1,000 (terminación de sotano y obra exterior).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

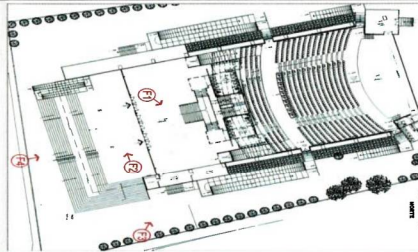

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Bvtd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros
#2358, Desarrollo Urbano 3 Rios, CP. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa.

FOTOS



Fachada lateral derecha iluminación exterior.



Fachada lateral izquierda iluminación exterior.

Comentarios de los trabajos realizados:



Conexión de planta de emergencia.



Espesjos en servicio sanitario.

Soila M. Gaxiola Camacho
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO

Jorge Pérez Rubio
ING. JORGE PÉREZ RUBIO

2021

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

31 de Marzo 2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: **Unidad Regional Centro. Campus Rafael Buelna, Culiacán, Sinaloa. Bienestar Universitario y ADIUAS Modulo de 10 entre ejes 3 niveles.**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO


Porcentaje de avance

100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

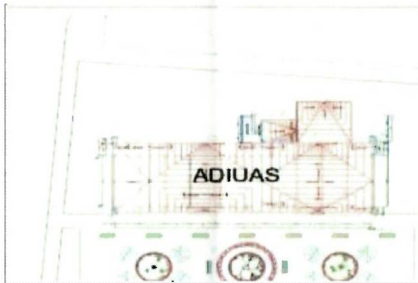

Bldv. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros
#2358, Desarrollo Urbano 3 Ríos, CP. 80020,
Culiacán de Rosales, Sinaloa.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:



Cimbrado de fosa



Pisos



Acabados



Zoclos ceramico

Sola M. Gaxiola Camacho
DRA. SOLA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO

Jorge Pérez Rubio
ARQ. JORGE PEREZ RUBIO

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

31 de Marzo 2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD 3

Nombre de la obra:

Unidad Regional Centro. Campus Rafael Buelna, Culiacan, Sinaloa. Construcción de Edificio para Archivo Integral DES de la IES.




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SONORA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO

Porcentaje de avance

100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

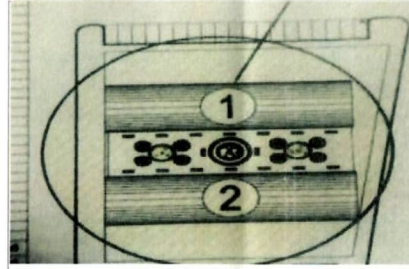

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Bvtd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros
#2358, Desarrollo Urbano 3 Ríos, CP. 80020, Culiacán
de Rosales, Sinaloa.

FOTOS



Cancelería



Piafon



Zoclo cerámico



cancelería

Comentarios de los trabajos realizados:

F5: Interior de aula

Soila M. Gaxiola Camacho
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO

ARG. JORGE PÉREZ RUBIO
